CampusTrade — Entregable Final de Desarrollo, Repositorio y Despliegue — Equipo 3 MEX-PER

Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Ingeniería en Sistemas Computacionales · Equipo 3 MEX-PER

Integrantes confirmados: Alexis Martin Cortés De Lucio y Brandon Joshua Labastida Jiménez.

Fecha de documentación: 30 de octubre de 2026. Versión candidata: 0.3.0-rc.2.

Repositorio: https://github.com/JoshStra/Compraventa_Peru_Mexico

Índice

Introducción · Objetivo y alcance · Metodología · 1. Backlog · 2. Issues · 3. Incidencias · 4. Estructura · 5. Colaboración · 6. PR · 7. Release y despliegue · Conclusiones · Anexos.

Introducción y objetivo

CampusTrade permite que estudiantes publiquen y encuentren materiales para venta, renta, intercambio y donación. Esta entrega transforma el prototipo local en una aplicación React/Express con PostgreSQL compartido. El objetivo es demostrar funcionalidad real, validaciones, trazabilidad de cambios y evidencia académica verificable, distinguiendo el código probado de las activaciones externas pendientes.

Alcance y metodología

Se contrastaron Especificación Técnica, Fase 2, Entregable 4 y Validación técnica del diseño aportados por el usuario. Sus descripciones se trataron como referencias de requisitos, sin dar por implementados sus diagramas propuestos. Se auditó main, se conservaron origin e historial y se integraron cambios en incrementos funcionales con pruebas antes del commit. Cada requisito enlaza código, prueba y SHA. Las fechas de Git se conservaron; no se simularon autores, revisiones ni despliegues.

Las pruebas locales usan datos sintéticos y PostgreSQL real. Se añadieron comprobaciones sobre Render, Neon y Supabase remotos. El dominio itesa.edu.mx está configurado; el envío real sigue pendiente por decisión del responsable. Se usaron únicamente planes Free, sin contratar servicios de pago.

1. Avance del backlog


El apartado 1 incluye catorce historias RF-01 a RF-14, prioridades, criterios, dependencias, responsable, fechas y commits. Todos tienen código. La verificación institucional necesita correo real. El adaptador S3 externo ya está probado con bucket privado; el recorrido productivo con alumno verificado sigue pendiente. RF-05 carece de un recorrido dedicado de donación. No se usa un porcentaje arbitrario de cumplimiento total.

Hitos reales: auditoría 09:49, API/PostgreSQL 09:52, cuentas 09:58, publicaciones 10:04, mensajes 10:08, operaciones 10:12, moderación 10:15, interfaz 10:35 y 10:47, correcciones 10:51 del 30 de octubre (UTC−06). El trabajo externo siguiente no tiene una fecha acordada con el curso.

2. Issues cerrados

El issue #1 confirma la separación frontend/backend pedida por JoshStra. El comentario de mora8292 detalla archivos y pruebas; cierre real 16:49:31Z. El issue #2 documenta dos regresiones reproducidas y corregidas en 6b0d297: cancelar solicitudes al retirar una oferta y serializar fechas civiles de renta. Cierre real 16:52:06Z. Ambos tienen comentario técnico real y evidencia de pruebas. El formulario completo está en apartado 2.

Figura 1. Issue de arquitectura cerrado con comentario, captura auténtica de GitHub. No representa una aprobación por PR.

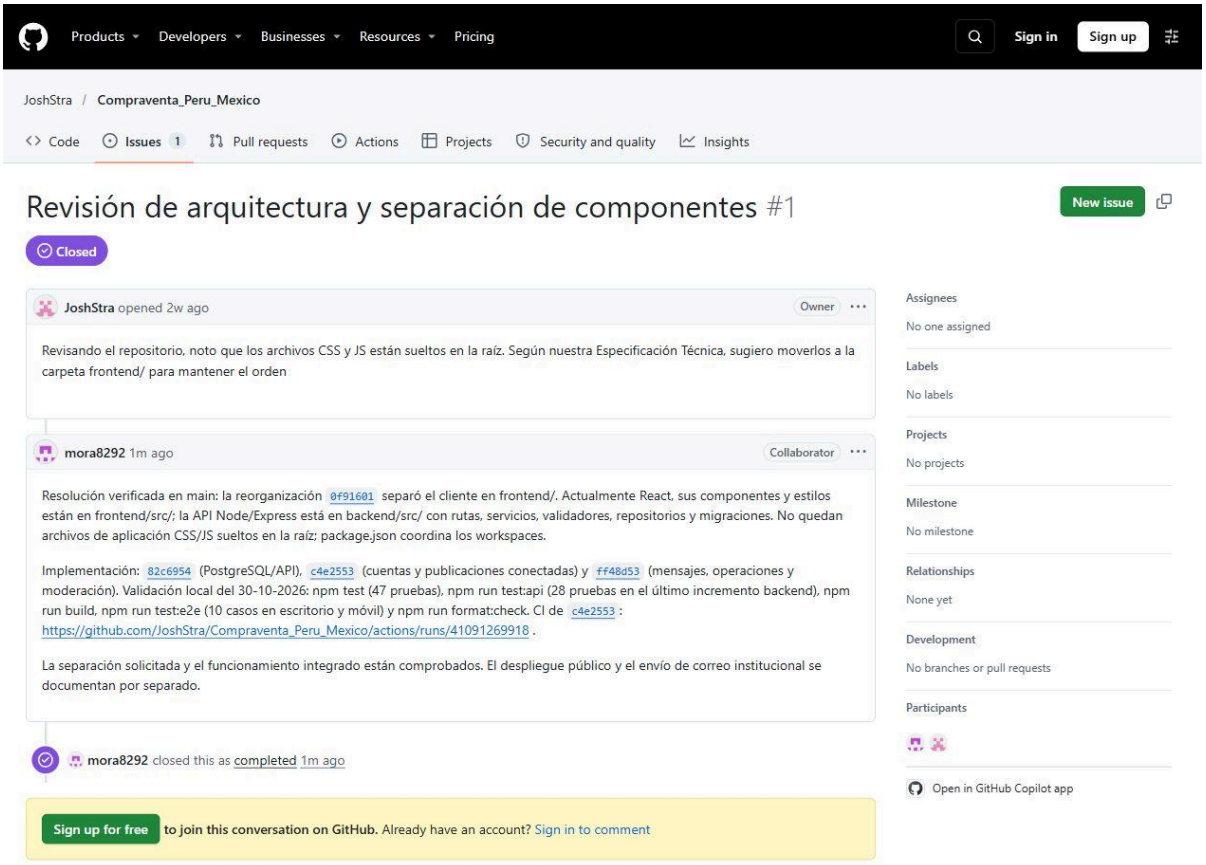


3. Logs de incidencias y soluciones

La bitácora registra fallos de formato en CI, lectura de imágenes bajo .data, enlace hash de verificación, selectores ambiguos de pruebas y los dos defectos del issue #2. No se ocultan ejecuciones fallidas: antes de corregir operaciones pasaron 27 de 29 pruebas; después pasaron treinta incluyendo reinicio de procesos. El apartado 3 detalla reproducción, severidad, causa, solución y estado.

Validación final: 47 pruebas frontend (44 de regresión local y tres de cliente HTTP), 34 API/config y diez E2E, compilación y formato. CI de f5130c1 terminó success. Además pasaron 28 comprobaciones HTTPS públicas y una prueba real del adaptador S3 privado. Se rechazan dominio, roles, campos, precios, imágenes, acceso ajeno y calificación anticipada inválidos. Los logs conservan los resultados reales.


Figura 2. Conversación entre dos usuarios sintéticos. El navegador y la API usan sesiones distintas y la información persiste en PostgreSQL local.

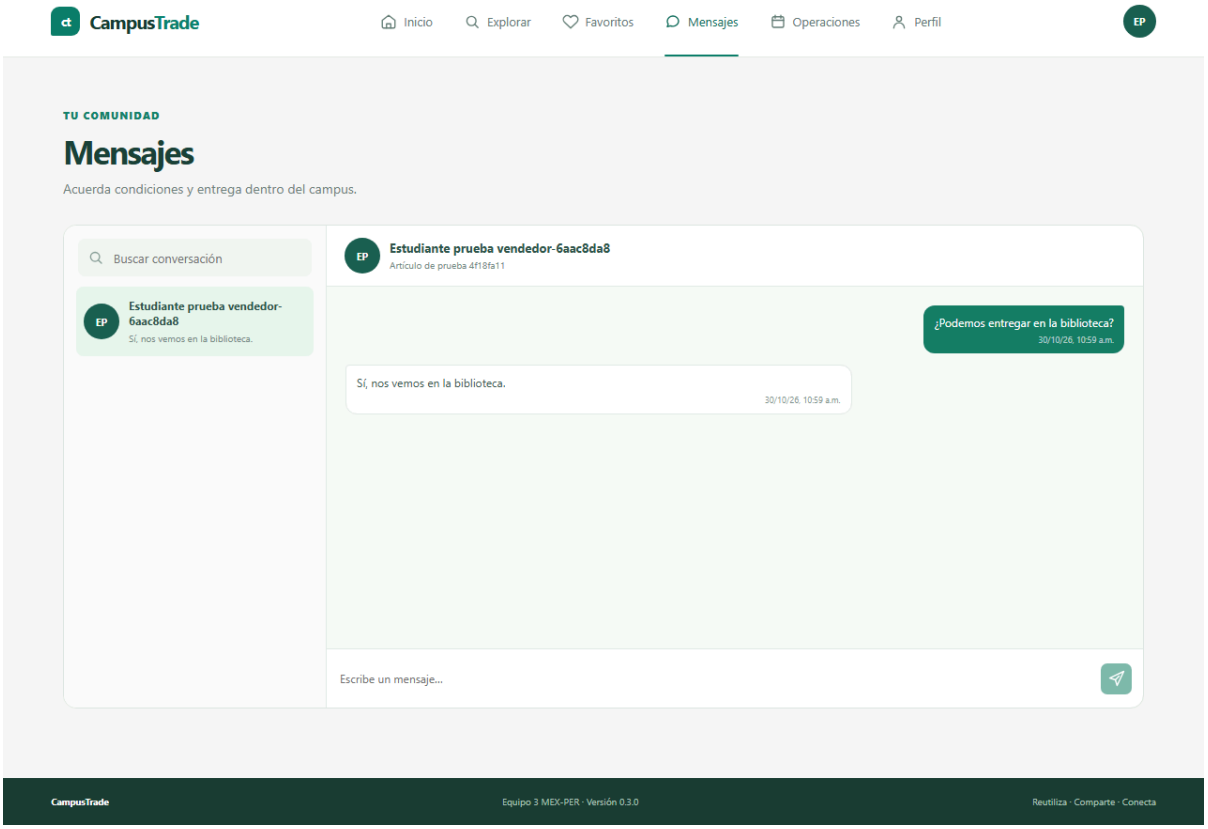

4. Estructura funcional

React → HTTP JSON con cookie/CSRF → Express → middleware de identidad y permisos → servicios → PostgreSQL. Las imágenes se guardan fuera de la base; el correo utiliza un adaptador. El servidor sirve frontend y API desde el mismo origen. Las migraciones 001/002 crean relaciones, rangos y unicidad; las reservas bloquean filas dentro de una transacción. El apartado 4 contiene el árbol real, diagrama de componentes y ER, enlazados a las migraciones.


La mensajería comprueba participación; la operación deriva identidad de la sesión y la calificación exige finalización. La moderación conserva auditoría; el administrador se promueve por CLI sobre una cuenta activa verificada, sin administrador predeterminado. Los listados recientes tienen límites documentados. Frontend/API, PostgreSQL y S3 remotos están comprobados; no se afirman microservicios.

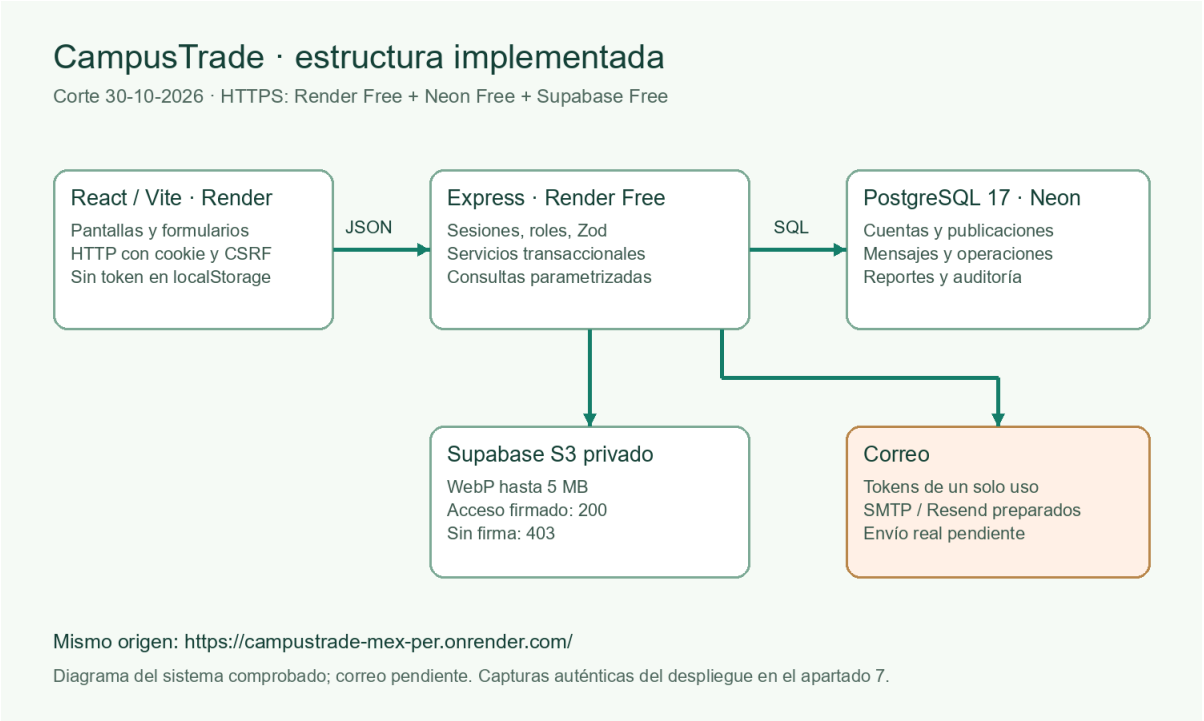

5. Uso activo del repositorio colaborativo

Se preservó https://github.com/JoshStra/Compraventa_Peru_Mexico y main. Brandon Labastida figura como autor de la base/reorganización; JoshStra creó CHANGELOG y abrió el issue #1; mora8292 registró los incrementos actuales y las resoluciones. Las cuentas GitHub contribuyentes observadas son JoshStra y mora8292. La conversación del issue muestra coordinación real, aunque los incrementos recientes proceden de una sola cuenta. No se atribuye el trabajo a personas sin evidencia. El apartado 5 conserva SHAs y fechas.

Figura 3. Historial real de commits. No se modificaron horarios ni se agregaron commits vacíos.

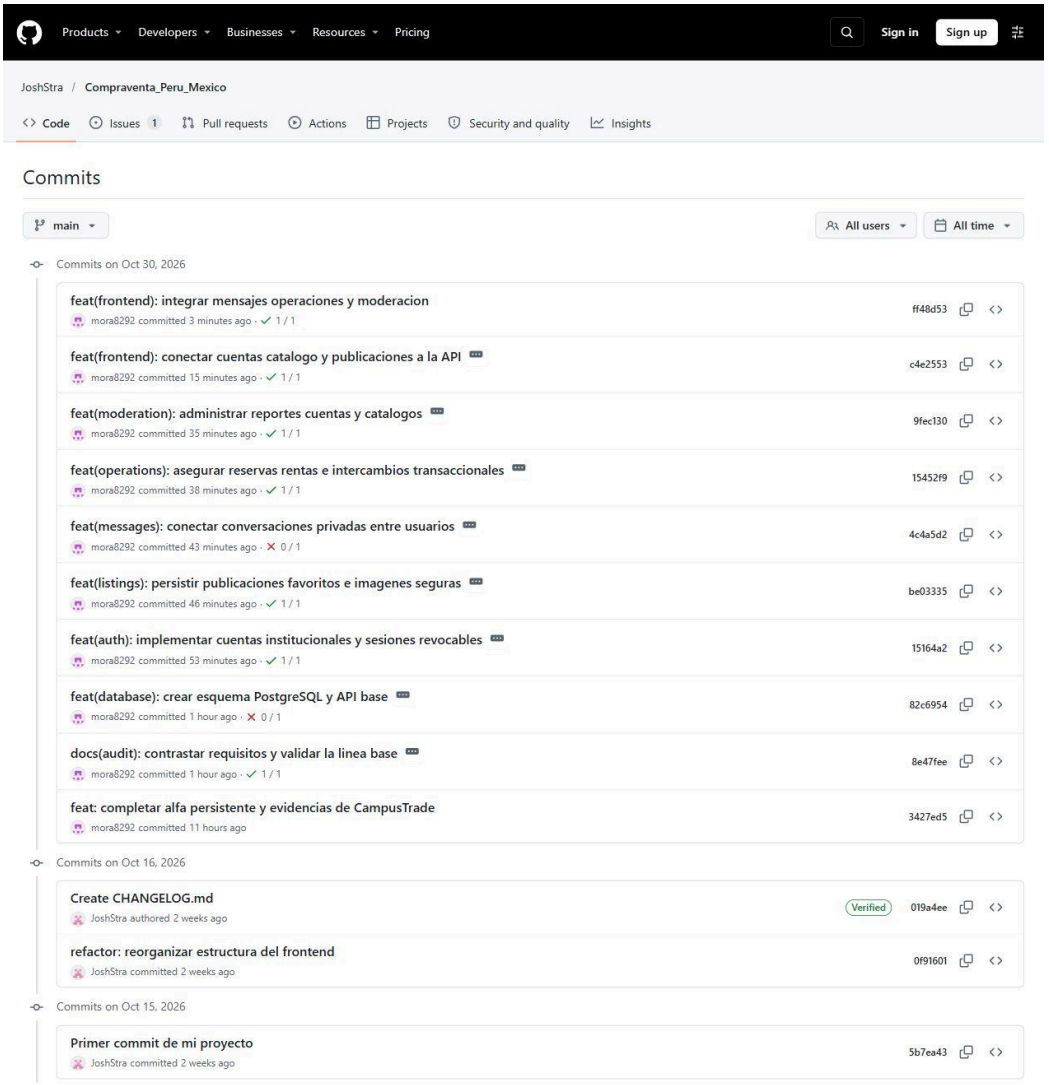

6. Pull requests revisados

La consulta de todos los PR devolvió cero resultados. El desarrollo directo en main estaba autorizado. No existen revisiones, revisores o aprobaciones que inventariar: criterio PENDIENTE de una revisión independiente real. La comprobación adicional de issues cerrados sí confirma estado completed, comentario, commit y pruebas en #1/#2. Véase apartado 6.

7. Releases y despliegue

Se conserva la candidata v0.3.0-rc.1 sobre addc154, publicada el 30-10-2026 a las 17:07:25Z. La candidata siguiente v0.3.0-rc.2 incorpora el despliegue real y sus evidencias;

la base de paquetes sigue en 0.3.0. Los tags anteriores no se mueven. El apartado 7 y el registro de publicación conservan los enlaces y SHAs.

Se desplegaron Render Free para frontend/API del mismo origen, Neon Free para PostgreSQL y Supabase Free para imágenes privadas. El primer despliegue quedó Live el 30-10-2026 a las 15:40:50 UTC−06, desde f5130c1. Neon usa TLS con certificado validado; las migraciones se ensayaron primero en una rama aislada. El bucket acepta WebP hasta 5 MB. Los secretos solo residen en backend/Render y configuración privada excluida de Git. Auto-deploy apagado.

Sistema público: https://campustrade-mex-per.onrender.com/ . Health: https://campustrade-mex-per.onrender.com/api/v1/health . Ambos HTTPS 200, database=connected. Hay capturas auténticas del servicio Live y de la aplicación. El correo permanece pendiente: no se verificaron alumnos artificialmente ni se probaron los recorridos productivos que lo requieren. La prueba S3 se ejecutó con el adaptador backend desde un cliente local autorizado, contra Supabase real.

Matriz final de la rúbrica

Criterio	**Estado**	**Justificación / evidencia**
1. Avance del backlog	CUMPLIDO	RF-01 a RF-14, historias, dependencias, criterios, responsables verificables y cronograma real en 01.
2. Issues cerrados	CUMPLIDO	#1 y #2 cerrados con comentario técnico, commit y regresiones; 02 y capturas.
3. Logs e incidencias	CUMPLIDO	Bitácora, fallos reales y validaciones positivas/negativas; 03 y logs.
4. Estructura funcional	CUMPLIDO	Árbol real, componentes, flujo y ER de las migraciones; 04.
5. Repositorio colaborativo	CUMPLIDO	Origin compartido, dos cuentas contribuyentes y conversación verificable; 05. No acredita revisión independiente.
6. PR revisados	PENDIENTE	Cero PR; revisión real de otro integrante por realizar. La comprobación de issues sí está completa.
7. Releases y despliegue	CUMPLIDO	HTTPS público en Render Free con Neon y S3 privado; health 200, pruebas y capturas auténticas en 07. Correo pendiente.

Conclusiones

CampusTrade está desplegado en HTTPS con cliente, API, PostgreSQL Neon y S3 privado Supabase. La evidencia conecta requisitos, pruebas, commits e issues y acredita el criterio 7. Permanecen pendientes el correo institucional, los recorridos productivos con alumnos consentidos y una revisión independiente por PR. La infraestructura publicada no acredita por sí sola aceptación funcional productiva completa.

Anexos y referencias

Referencias de despliegue: Render Free, Neon Free, Supabase S3. Referencias de controles: Express, transacciones node-postgres, OWASP contraseñas.

Evidencia del despliegue real

Render confirmó el redespliegue Live el 30-10-2026 a las 15:52:56 UTC−06, SHA e4b14ff. La candidata v0.3.0-rc.2 se publicó a las 21:54:26Z sobre ese mismo commit; el tag rc.1 se conserva.

Pasaron 28 comprobaciones HTTPS iniciales y 26 después del redespliegue. La cuenta y su sesión persistieron en Neon. El mismo WebP de Supabase conservó su hash: lectura firmada 200, anónima 403. El correo y los recorridos productivos con alumnos verificados siguen pendientes.

Aplicación pública · Health de API · Release v0.3.0-rc.2

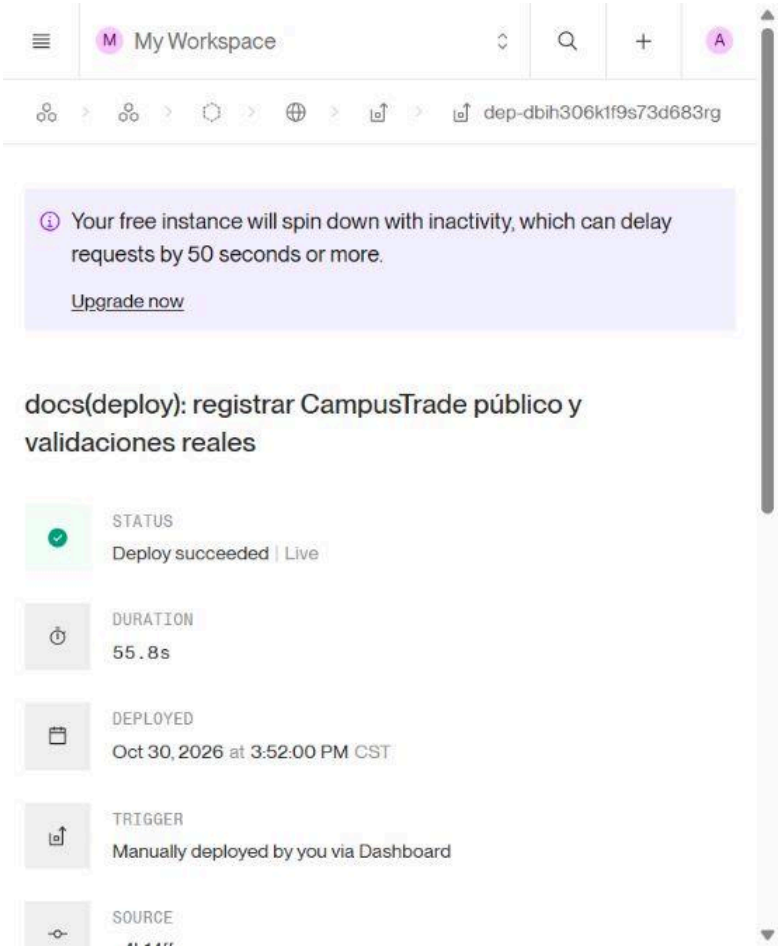


Figura 5. Render Free: redespliegue real Live, fecha y commit de origen. Captura auténtica del panel; no contiene secretos.
